

令和8年5月11日

賃金等の変動に対する工事請負契約約款第24条第6項の規定 (インフレスライド条項)の運用について

工事請負契約約款第24条第6項の規定により、葛飾区が発注・契約する工事において、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いについては、以下のとおりとする。

受注者は、請求に当たって、工事主管課と十分な協議を行うこと。また、契約金額が変更された場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、労務者への賃金水準引き上げ等について一層の対応を行うこと。

1 適用対象工事

- (1) 工事請負契約約款にインフレスライド条項が規定された工事
- (2) 2(3)の残工事が2月以上ある工事

2 定義

- (1) 請求日
インフレスライド条項により、受注者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とする。
- (2) 基準日
スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日とする。請求日と同じ日とすることを基本とするが、請求日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができる。
- (3) 残工期
基準日以降の工期までの工事期間とする。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができる。
- (4) 出来形数量
基準日における既済部分に係る設計数量
- (5) スライド額
5により契約変更の対象となる額

3 請求方法

- (1) 受注者がインフレスライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合、書面（様式1-1）に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料（様式1-2ほか）を添付し、工事主管課に提出する。工事主管課は、スライド額協議基準日及び開始日を定め、請求日から7日以内に、受注者に通知する。（様式2-1）
- (2) 請求は、直近の賃金水準等の変更から次の賃金水準等の変更がなされるまでに行うこと。

4 出来形数量の確認

- (1) スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、工事主管課は、請求日から14日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行う。受注者は、出来形数量の確認に当たり、必要な資料を提出する。
- (2) 出来形数量の確認は、工事設計内訳書等に対応して行う。
- (3) 出来形数量の基本的な扱い
 - ア 現場搬入材料について、区監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱う。
 - イ 工事設計内訳書等で一式計上した仮設工事等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とする。
 - ウ 受注者は、各工事におけるア及びイの詳細について、工事主管課へ確認する。
- (4) 受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含むものとする。

5 スライド額の算出

- (1) スライド額は、次式により算出する。
$$S = [P2 - P1 - (P1 \times 1 / 100)] \times (\text{消費税及び地方消費税の税率})$$

この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表す。

S : スライド額

P1 : 変動前残工事金額（契約金額から、基準日における既済部分に相当する契約金額を控除した額）（税抜き）

$$P1 = \alpha \times Z1$$

P2 : 変動後残工事金額（変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した（P1）に相当する額）（税抜き）

$$P2 = \alpha \times Z2$$

α : 落札率（当初契約金額／予定価格）（有効数字は積算基準による）

Z 1 : 発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額 (税抜き)

Z 2 : 変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した (Z 1) に相応する額 (税抜き)

- (2) P 1 及び Z 1 の算出に用いる単価は、起工時における区積算単価とする。
- (3) P 2 及び Z 2 は、基準日の物価指数等 (積算に使用する単価の変動率) により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出する。ただし、協議資料等に基づき、発注者及び受注者双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができる。
- (4) P 2 及び Z 2 を算出する際に用いる単価については、基準日時点の区積算単価とする。
- (5) (4) によることが著しく不相当であると認められる場合には、発注者及び受注者の協議によることとする。
- (6) 発注者は、協議書 (様式 3-1) により受注者にスライド額を提示する。受注者は、異議のない場合、スライド額協議開始日から 14 日以内に承諾書 (様式 3-2) を提出する。
なお、スライド額協議開始日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知する。(様式 3-3)

6 契約変更の時期


原則として、スライド額の決定後、速やかに行う。ただし、精算変更時点で行うこともできる。

7 手続きの流れ

手続きの流れについては、別紙「インフレスライドの手続きフロー」のとおり

インフレスライドの手続きフロー

～請求から契約変更手続きまでの基本的な流れ～

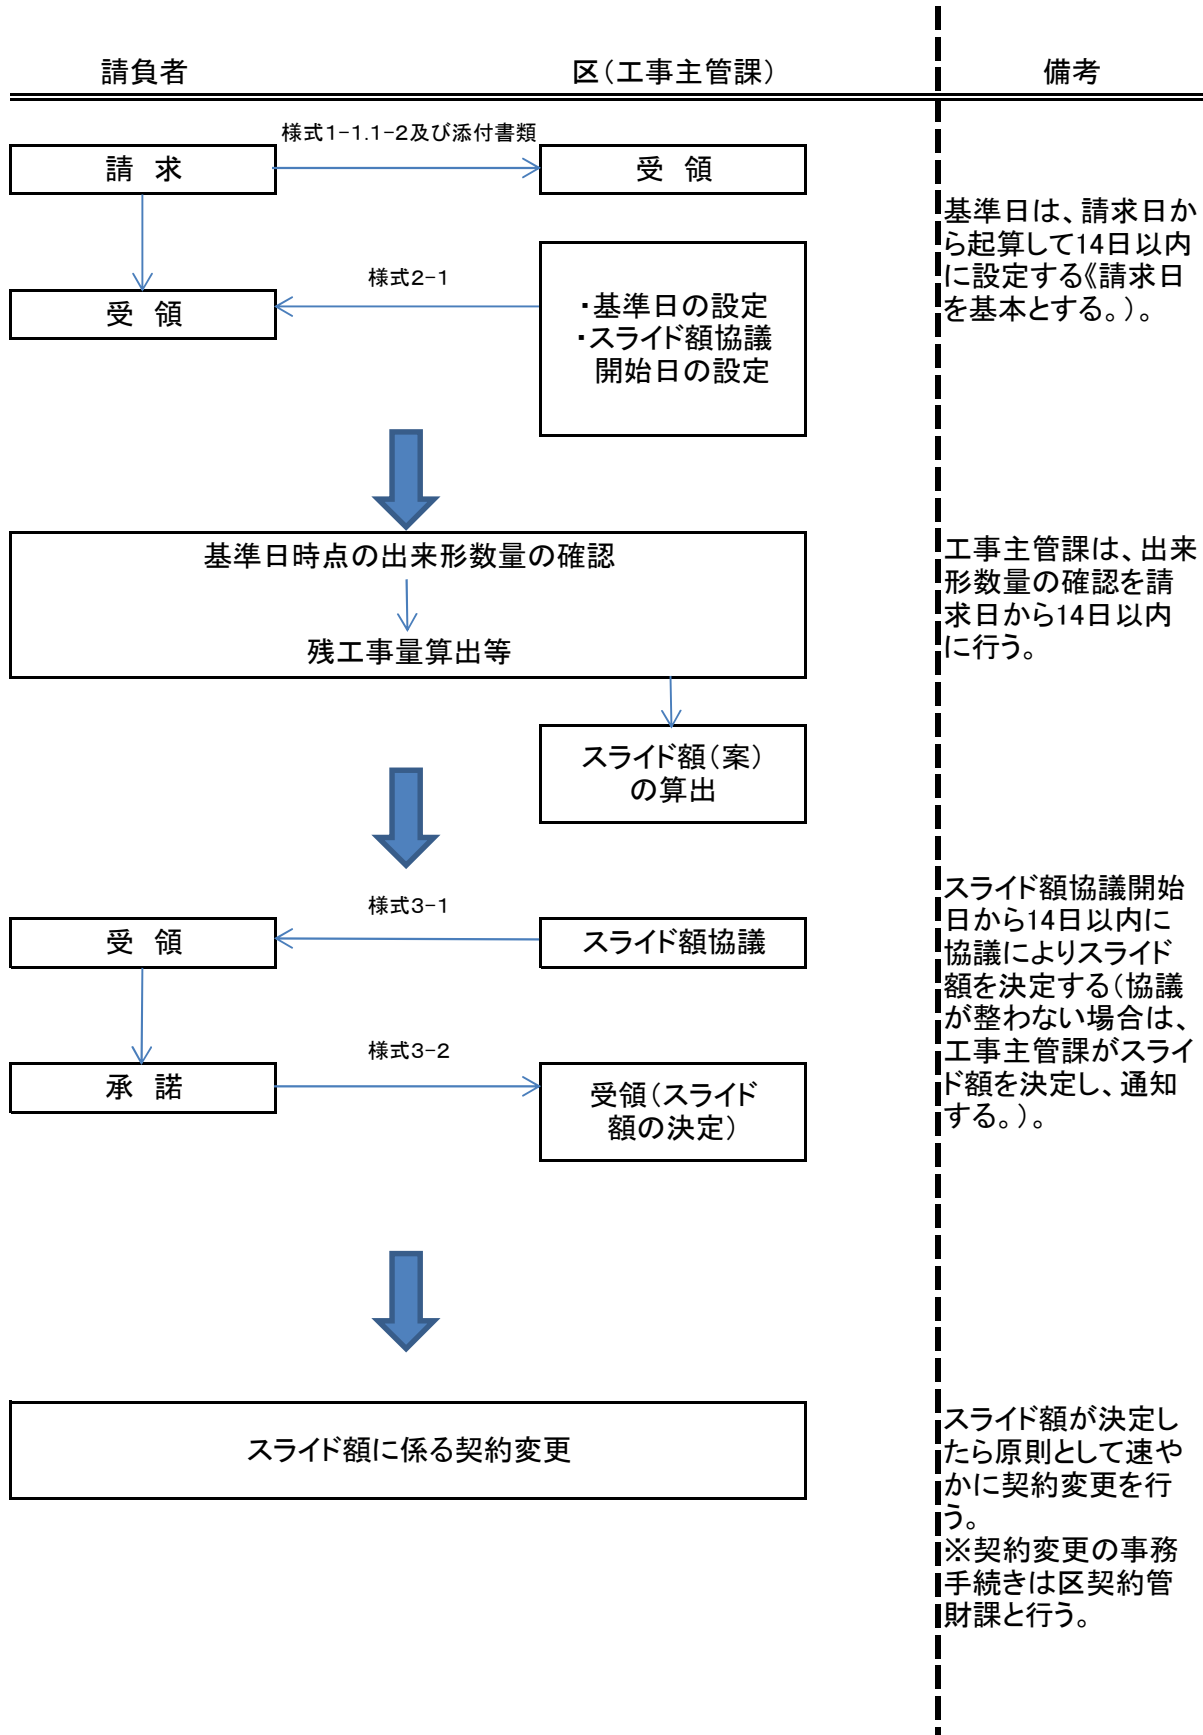

[請負者からの請求]

年 月 日

(発注者あて)

殿

住所
請負者
氏名 印

〔 法人の場合は名称
及び代表者の氏名 〕

工事請負契約約款第24条第6項の規定による契約金額の変更（請求）

年 月 日付けで契約締結した下記の工事については、賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不相当となったため、工事請負契約約款第24条第6項の規定により契約金額の変更を請求します。

記

- 1 工 事 件 名
(案件番号) ()
- 2 契 約 金 額 ¥
- 3 契 約 日 年 月 日
- 4 工 期 契約締結日の翌日から 年 月 日まで
- 5 工 事 場 所
- 6 希 望 基 準 日 年 月 日
- 7 変 更 請 求 概 算 額 ¥
- 8 概 算 変 動 前 残 工 事 金 額 ¥

(概算変動前残工事金額とは、契約金額から当該請求日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)

- ※ 希望基準日は、この請求を提出する日から起算して14日以内とする。
- ※ 別紙「概算スライド額調書」(様式1-2)を添付する。
- ※ 区監督員と相談の上、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料を添付する。
- ※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によって、変更となることがある。
- ※ 工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合には、その旨を確認するための資料を添付する。

概算スライド額調書

工 事 件 名 (案 件 番 号)	()
契 約 金 額	円 (税込み)
予 定 価 格	円 (税込み)
落 札 率	. %
契 約 日	年 月 日
工 期	契約締結日の翌日から 年 月 日まで
希 望 基 準 日	年 月 日
出 来 高	. %
出 来 高 額 (既済部分に相応する契約金額)	円 (税抜き)
変 動 前 残 工 事 金 額 (P1)	円 (税抜き)
変 動 後 残 工 事 金 額 (P2)	円 (税抜き)

$$\begin{aligned}
 \text{○税抜スライド額 (S')} &= P2 - P1 - \left(P1 \times 1 / 100 \right) \\
 &= \quad - \quad - \left(\quad \times 1 / 100 \right) \\
 &= \quad - \\
 &=
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{○スライド額 (S)} &= (S') \times (\text{消費税及び地方消費税の税率}) \\
 &=
 \end{aligned}$$

- P1 : 変動前残工事金額 (税抜き)
(契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額)
- P2 : 変動後残工事金額 (税抜き)
(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額)

- ※ 出来高、出来高額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。
ただし、精査の結果によっては、これらを変更することがある。
- ※ 落札率は、入札経過調書等を参考に、小数点以下1位まで記入する。

(様式2-1)
(文書番号)
年 月 日

(請負者あて)

殿

(工事主管課)

工事請負契約約款第24条第6項の請求に係る基準日及び協議の開始の日(通知)

年 月 日付けで請求のあった「工事請負契約約款第24条第6項の規定による契約金額の変更(請求)」については、下記のとおり基準日を定めるとともにスライド額の協議を開始します。

記

1 工事件名
(案件番号)

2 基準日 年 月 日

3 協議開始日 年 月 日

(様式3-1)
(文 書 番 号)
年 月 日

(請負者あて)

殿

(発注者)

工事請負契約約款第24条第6項に基づく契約金額の変更について (協議)

年 月 日付で請求のあった「工事請負契約約款第24条第6項の規定による契約金額の変更 (請求)」については、工事請負契約約款第24条第7項に基づき、下記のとおり協議します。

なお、異議のないときは、回答期日までに承諾書を提出してください。

記

1 工 事 件 名
(案件番号)

2 変動前残工事金額 (税抜き) ¥ . -

3 変動後残工事金額 (税抜き) ¥ . -

4 スライド額 (税抜き) ¥ . -

(税込み) ¥ . -

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ . -)

5 契約変更予定時期

- ・協議が整い次第、速やかに行う。
- ・精算変更時に行う。
- ・その他 ()

6 回答期日 年 月 日

年 月 日

(発注者あて)

殿

住所
請負者
氏名 印

〔 法人の場合は名称
及び代表者の氏名 〕

承 諾 書

年 月 日付 (文書番号) により協議があったスライド額等については、下記のとおり承諾します。

記

1 工 事 件 名
(案件番号)

2 変動前残工事金額 (税抜き) ￥ _____ . -

3 変動後残工事金額 (税抜き) ￥ _____ . -

4 スライド額 (税抜き) ￥ _____ . -

(税込み) ￥ _____ . -

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ _____ . -)

年 月 日

(請負者あて)

殿

(発注者)

工事請負契約約款第24条第7項の規定によるスライド額（通知）

年 月 日付（文書番号）によりスライド額等の協議をしましたが、協議が整わず、
年 月 日の回答期日までに承諾をいただけませんでした。

については、工事請負契約約款第24条第7項の規定により、スライド額等を下記のとおり
定めたので通知します。

記

1 工事件名
（契約番号）

2 変動前残工事金額（税抜き） ¥ . —

3 変動後残工事金額（税抜き） ¥ . —

4 スライド額 （税抜き） ¥ . —

（税込み） ¥ . —

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ . —）

- 5 契約変更予定時期
- ・協議が整い次第、速やかに行う。
 - ・精算変更時に行う。
 - ・その他（ ）
